

#MejoresRegiones



UNIDAD DE TERRITORIOS DE CONVERGENCIA
INFORME DE SEGUIMIENTO TÉCNICO/FINANCIERO MENSUAL

PLAN ESPECIAL DE DESARROLLO DE ZONAS EXTREMAS	
PLAN DE DESARROLLO PARA ZONAS REZAGADAS EN MATERIA SOCIAL	X
FONDO DE DESARROLLO LOCAL	

Nota: Estas asignaciones podrán variar de acuerdo con lo expresado en la Ley de Presupuestos para el Sector Público de cada año.

Región: Atacama

Nombre del Plan: Plan Freirina Sustentable 2021-2029

Fecha: 02/05//2022

Mes que reporta: Marzo 2022

Avance Técnico del Plan %: 2,11

Avance Financiero del Plan %: 4,02

Indique cuáles han sido las gestiones realizadas por el equipo, para la ejecución del plan y su correcta implementación. Considere: Reuniones sostenidas con actores locales y sectoriales, oficios emitidos, resultados alcanzados. (Adjunte medios de verificaciones; listas de asistencia de actores locales y sectoriales, actas etc.).

Actividades Realizadas:

Gestión reporte marzo 2022, a Unidad de Territorios y Convergencia:

- Se completa información proyectos Plan Freirina Sustentable, planilla con avances de seguimiento 2022.
- El jueves 24 de marzo realizamos reunión por videoconferencia con equipo de Plan de Rezago Gobierno Regional de Valparaíso, para intercambio de experiencias en la ejecución del Plan.

Indique cuáles han sido las problemáticas vinculadas a la ejecución o nudos críticos evidenciados al momento de la ejecución del Plan y las acciones a nivel regional realizadas para poder subsanarlas. Considere la unidad técnica referente, el tipo de observación entregada, licitaciones sin oferentes, falta de priorización, no respuestas a la reportabilidad solicitada, desestimación de iniciativas.

En relación a las problemáticas visualizadas hasta ahora, en la ejecución del Plan, se detalla a continuación:

Los nudos críticos ha sido la información financiera de la reportabilidad sectorial, que no coincide muchas veces con la información de Chileindica, eso hace que podamos cometer errores en la información, como ejemplo en algunos proyectos del MOP, en Chileindica se encuentran como bolsas de proyectos y es muy complejo saber cuál es el verdadero gasto focalizado al Plan de Rezago.

#MejoresRegiones



De las gestiones realizadas, indique cuáles son los principales acuerdos, compromisos y/o hallazgos respecto a las iniciativas del plan analizadas (Especifique Códigos de las iniciativas). Considere medios de verificación, plazos, mecanismos de seguimiento de los acuerdos o compromisos.

1.-Programa Mejoramiento de Barrios- proyecto "Asistencia técnica apoyo infraestructura Plan en Zona de Rezago", código BIP 3303211001-C; proyecto incluido dentro de la transferencia consolidada. Profesionales contratados a contar del mes de enero 2022.

2.-EL proyecto "Electrificación e iluminación varios sectores de la comuna de Freirina", código BIP 3303210702-C; bases administrativas y expediente técnico fue derivado a Contraloría Regional de Atacama, en el marco de la revisión previa de juridicidad de los procesos de contratación, para posterior realización del proceso licitatorio.

3.-Proyecto "Construcción centro de educación ambiental caleta Chañaral de Aceituno, Freirina, código BIP 40031167. En proceso de elaboración y formulación de proyecto. Se obtuvieron documentos previos con respecto al terreno, uso y factibilidades, entre ellos el certificado de informes previos, certificado de factibilidad eléctrica, en proceso certificado de alcantarillado y agua potable. En avance el diagnóstico para la elaboración del perfil del proyecto.

4.-Proyecto "Protección y transferencia de conocimiento para la conservación de la Isla de Chañaral, de la Reserva Nacional Pingüino de Humboldt", Freirina, código BIP 40031110. Se adjunta solicitud del servicio modificación de iniciativas. Ex nombre: Protección del pingüino y Yunco, y control de sus amenazas en la Isla de Chañaral, Freirina. Se comenzará la elaboración del perfil, durante el segundo semestre 2022.

5.-Proyecto "Construcción Infraestructura para Isla Chañaral de Aceituno, Freirina", Código BIP 40031170. Convenio firmado con DOP con objeto de colaborar como entidad y contraparte técnica para la formulación y gestión de la iniciativa.

6.-Proyecto "Mejoramiento Paseo San Francisco, Altiplano Sur Freirina. Código BIP 30135440, iniciativa que aún no inicia su ejecución.

7.-Proyecto "Transferencia programa apoyo productivo pequeña minería región de Atacama, código BIP 40011665, programa en formulación de las bases fondo concursable 2022, se tiene proyectado inicio de postulación programa mes de mayo 2022.

#MejoresRegiones



Indique las gestiones relevantes realizadas en materia financiera para la ejecución del plan y sus iniciativas. Considere: La variación de la ejecución presupuestaria del plan respecto del periodo anterior, solicitudes de recursos, validaciones o confirmación de la información financiera del plan en plataforma Chileindica y/o SIGFE del mes correspondiente.

-En relación a la iniciativa "Mejoramiento Paseo San Francisco, Altiplano Sur Freirina", la Municipalidad de Freirina compra terreno Paseo San Francisco por M\$ 1400, a la fecha no se ha reportado avance de las iniciativas financiadas con dicho fondo y al mismo tiempo no se refleja en la plataforma Chileindica y de SUBDERE.

Este proyecto fue desarrollado en su etapa de Diseño por la SEREMI MINVU ATACAMA, pero para la etapa de ejecución, GORE Atacama firmó Convenio Mandato con la Ilustre Municipalidad. La División de Presupuesto e Inversión Regional, informa que el proyecto será financiado con recursos FNDR. Del MINVU solicitan bajada de la cartera sectorial.

-La iniciativa productiva comprometida de INDAP, es el Programa de Desarrollo Local (PRODESAL), el cual se desarrolla en Freirina a través de un convenio con la Ilustre Municipalidad de la comuna por un periodo de 4 años desde 2020 a 2023. El programa, que se encuentra en ejecución, atiende a 169 pequeños productores agrícolas a través de Asesorías Técnicas e Inversiones Productivas. Para el año 2022 los recursos se encuentran aprobados por un monto de \$63.415.787, de los cuales ya se ha transferido a la municipalidad un monto de \$16.598.260, que representa un 26% del total anual aprobado.

Respecto de las iniciativas contenidas en el plan, indique cuáles de estas han tenido modificaciones estado de avance técnico y/o financiero, de acuerdo con su programación.

Se adjuntan proyectos y estados de avance a marzo 2022

-Proyecto "Camino Básico por Conservación: Ruta C-450, Cruce C-46 (Maitencillo) - Cruce C-440 (La Varilla), km 0 al km 28,207, Provincia de Huasco, Región de Atacama. Código BIP 30353380-0, Se encuentra adjudicada. Pagos: Programados desde Junio a diciembre 2022.

Con respecto al tramo desde el Km. 0 al 2,500, se encuentra en el departamento de proyectos afinando los antecedentes de licitación, este se financiará a través de FNDR.

-Proyecto "Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta C-500 El Morado- Chañaral de Aceituno, código BIP: 40020322-0, Proyecto de camino a nivel de Ingeniería de detalle se encuentra terminado. Actualmente se encuentra en desarrollo el proyecto de expropiaciones.

-Proyecto "Mejoramiento Camino Básico Intermedio Ruta C-462. Puente Los Guindos- la Arena- Comuna de Freirina Provincia de Huasco; Región de Atacama, código BIP: 40011741-0, En proceso de análisis por parte de la Dirección de Vialidad, la empresa no ha dado respuesta frente a la adjudicación por lo tanto se desestimaré o liquidará el contrato.

-Proyecto "Construcción sitio propio (DS10- programa habitabilidad rural), código BIP 19868/18140, Mediante Ord. N°363 /0704,2022, se remitió a la I. Municipalidad de Freirina pronunciamiento sobre riesgos de desastres de los sitios donde se emplazan los CSP. Dando V°B°.

#MejoresRegiones



Indique las observaciones entregadas por las unidades técnicas sobre visitas a terreno informadas por el inspector técnico y/o encargado de programa sobre la ejecución de las iniciativas del mes correspondiente y mencione las iniciativas a visitar el próximo mes con su respectiva fecha. Considere hito de primera piedra, lanzamientos de programas, finalización de obras, finalización de programas, entrega de proyectos y/o cierre de proyectos.

Se informara próximo mes hitos, o finalización de proyectos.

Indique otras observaciones relevantes asociadas a la ejecución del plan (iniciativas que no inician, desestimadas, que no han cumplido con la fecha estimada de inicio, entre otras).

Se contempla realizar reunión durante el mes de abril 2022.

Durante el mes de abril se considera realizar una reunión de planificación y programación con los servicios públicos con compromisos en el plan, en la comuna de freirina para realizar un seguimiento más eficiente.

Indique las gestiones realizadas por el equipo ejecutor del plan, para potenciar la difusión y transparencia y rendición de cuentas sobre los avances y resultados alcanzados por este en el periodo reportado. Considere: balances, inauguraciones, lanzamientos, rendición de cuentas, cuentas públicas, notas beneficiarias, páginas web y/u otros.


En reunión sostenidas por equipo Diplade se toma el acuerdo de hacer reunión en la comuna de Freirina en abril para presentar el estado de avance de la ejecución del Plan y así dar a conocer el material de difusión del Plan.

Indique las gestiones realizadas en el marco del plan para la sostenibilidad de este. Considere formulación de convenios de programación u otros convenios, programas, alianzas, entre otros.

No se registran para este informe

Nota: Se reitera adjuntar medios de verificación que respalde la información reportada.

PLAN
FIRMA Y TIMBRE JEFATURA DIVISION

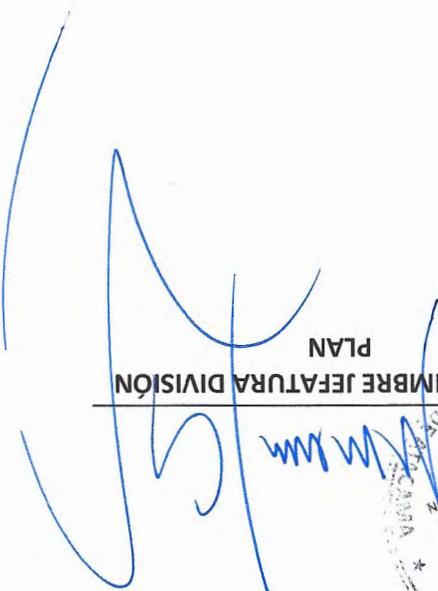

GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA
DIVISION DE PLANIFICACION Y DESARROLLO
REPUBLICA DE CHILE

PLAN
FIRMA Y TIMBRE COORDINADOR(A)



GOBIERNO REGIONAL DE ATACAMA
ENCARGADO DE AREA DE PLANIFICACION TERRITORIAL
DR. RAUL
REPUBLICA DE CHILE

